



Übersicht Bauetappen

Etappenplan vom 4. September 2019

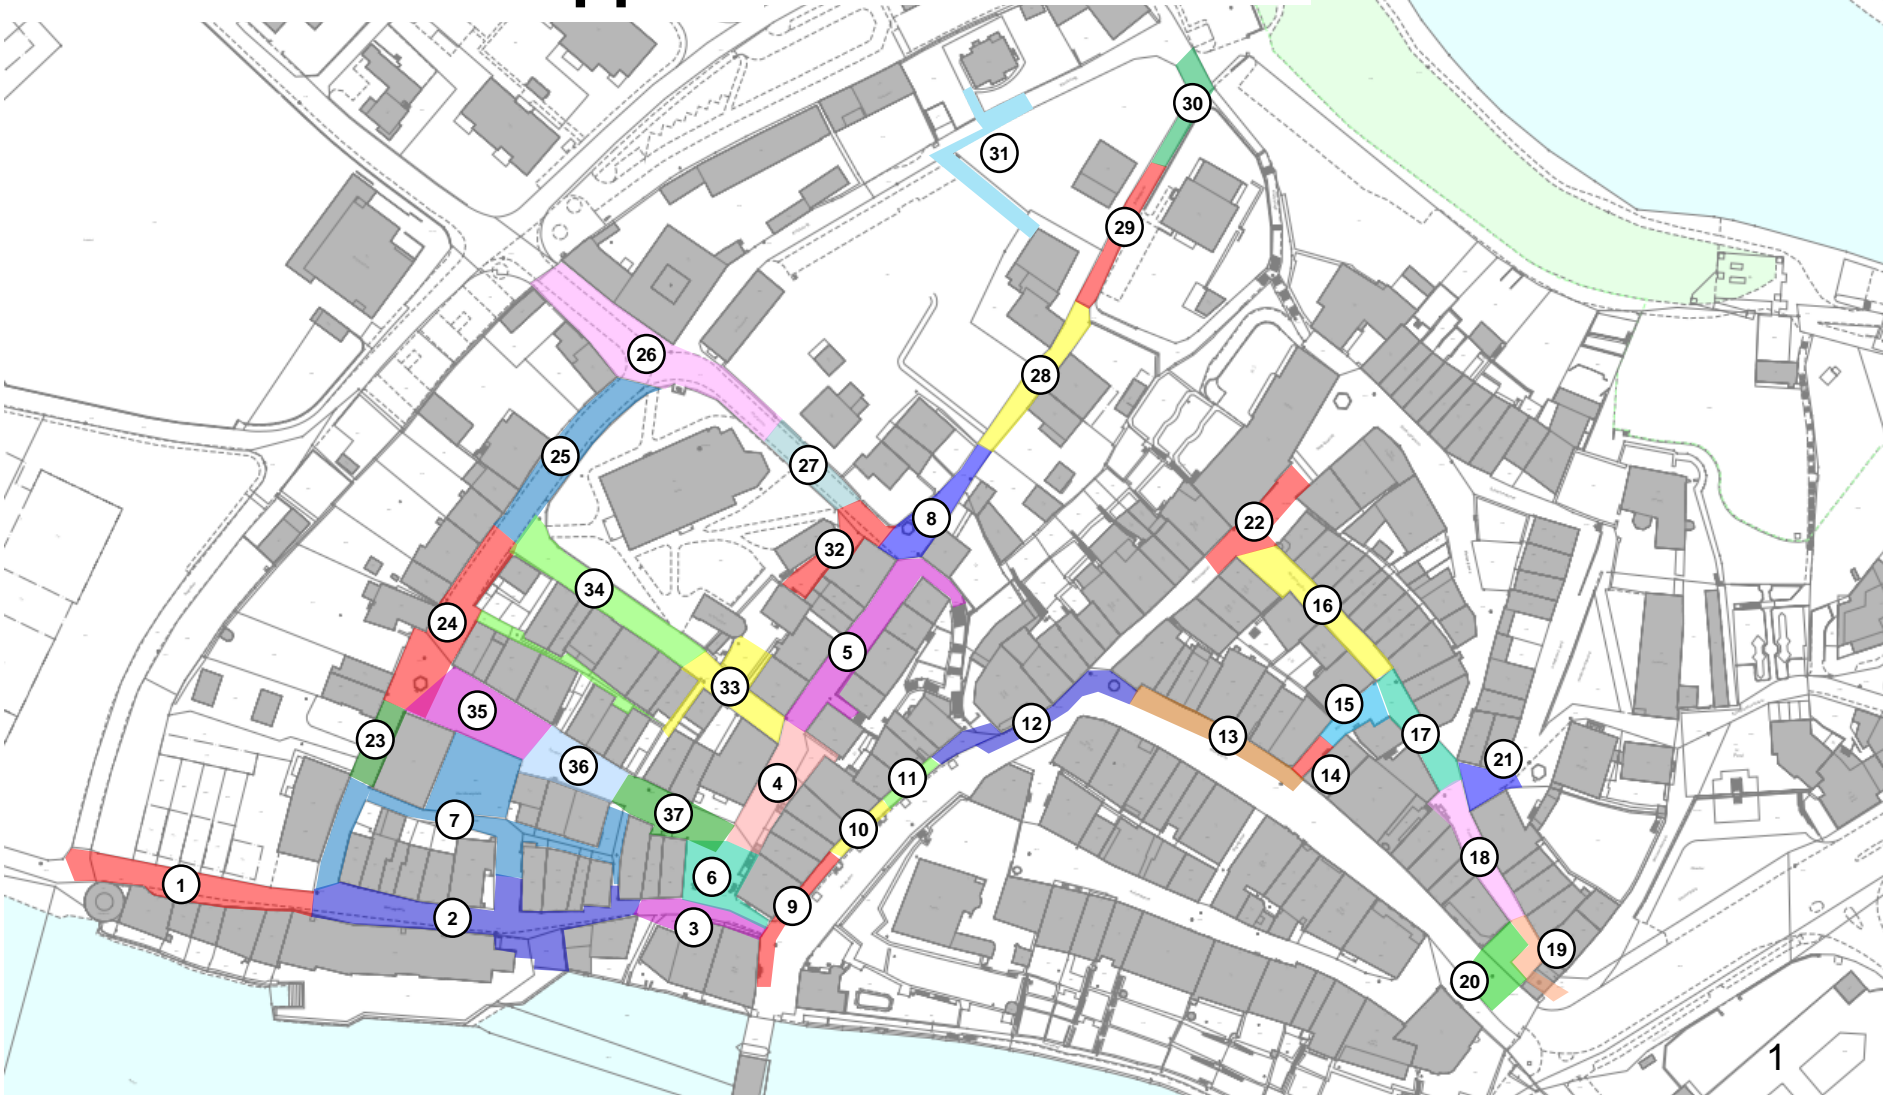

Daten Bauetappen

Etappenplan vom 4. September 2019

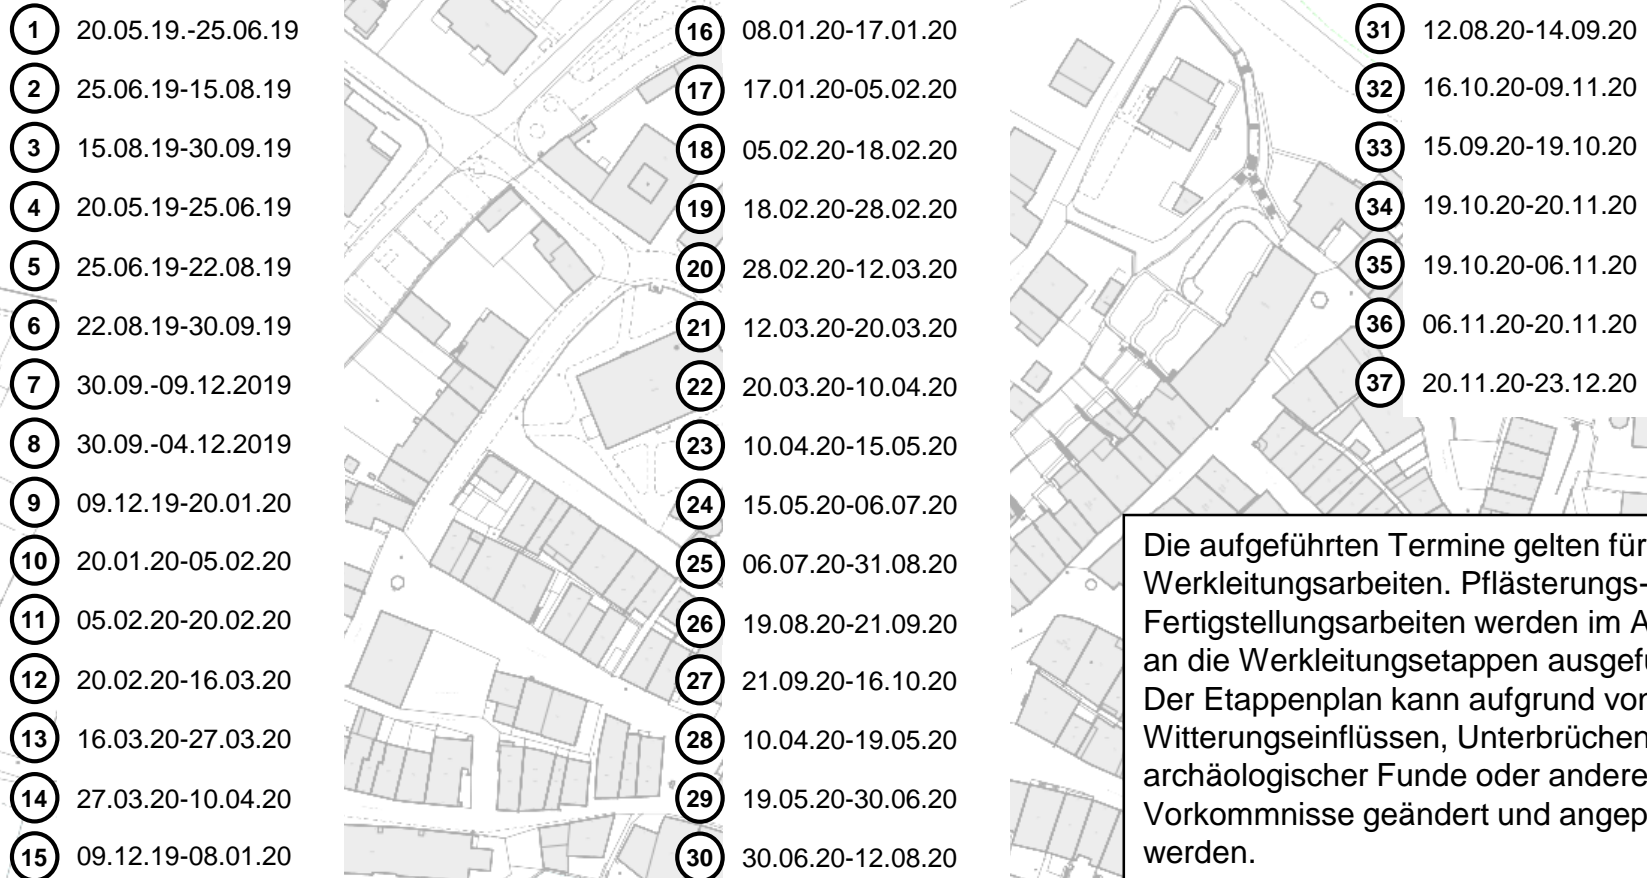


1	20.05.19.-25.06.19	16	08.01.20-17.01.20	31	12.08.20-14.09.20
2	25.06.19-15.08.19	17	17.01.20-05.02.20	32	16.10.20-09.11.20
3	15.08.19-30.09.19	18	05.02.20-18.02.20	33	15.09.20-19.10.20
4	20.05.19-25.06.19	19	18.02.20-28.02.20	34	19.10.20-20.11.20
5	25.06.19-22.08.19	20	28.02.20-12.03.20	35	19.10.20-06.11.20
6	22.08.19-30.09.19	21	12.03.20-20.03.20	36	06.11.20-20.11.20
7	30.09.-09.12.2019	22	20.03.20-10.04.20	37	20.11.20-23.12.20
8	30.09.-04.12.2019	23	10.04.20-15.05.20		
9	09.12.19-20.01.20	24	15.05.20-06.07.20		
10	20.01.20-05.02.20	25	06.07.20-31.08.20		
11	05.02.20-20.02.20	26	19.08.20-21.09.20		
12	20.02.20-16.03.20	27	21.09.20-16.10.20		
13	16.03.20-27.03.20	28	10.04.20-19.05.20		
14	27.03.20-10.04.20	29	19.05.20-30.06.20		
15	09.12.19-08.01.20	30	30.06.20-12.08.20		

Die aufgeführten Termine gelten für die Werkleitungsarbeiten. Pflasterungs- und Fertigstellungsarbeiten werden im Anschluss an die Werkleitungsetappen ausgeführt. Der Etappenplan kann aufgrund von Witterungseinflüssen, Unterbrüchen wegen archäologischer Funde oder anderer Vorkommnisse geändert und angepasst werden.

Etappe 1 Reussgasse/Schenkgasse

Mitte Mai bis Anfang Oktober 2019

Dauer ca. 22 Wochen

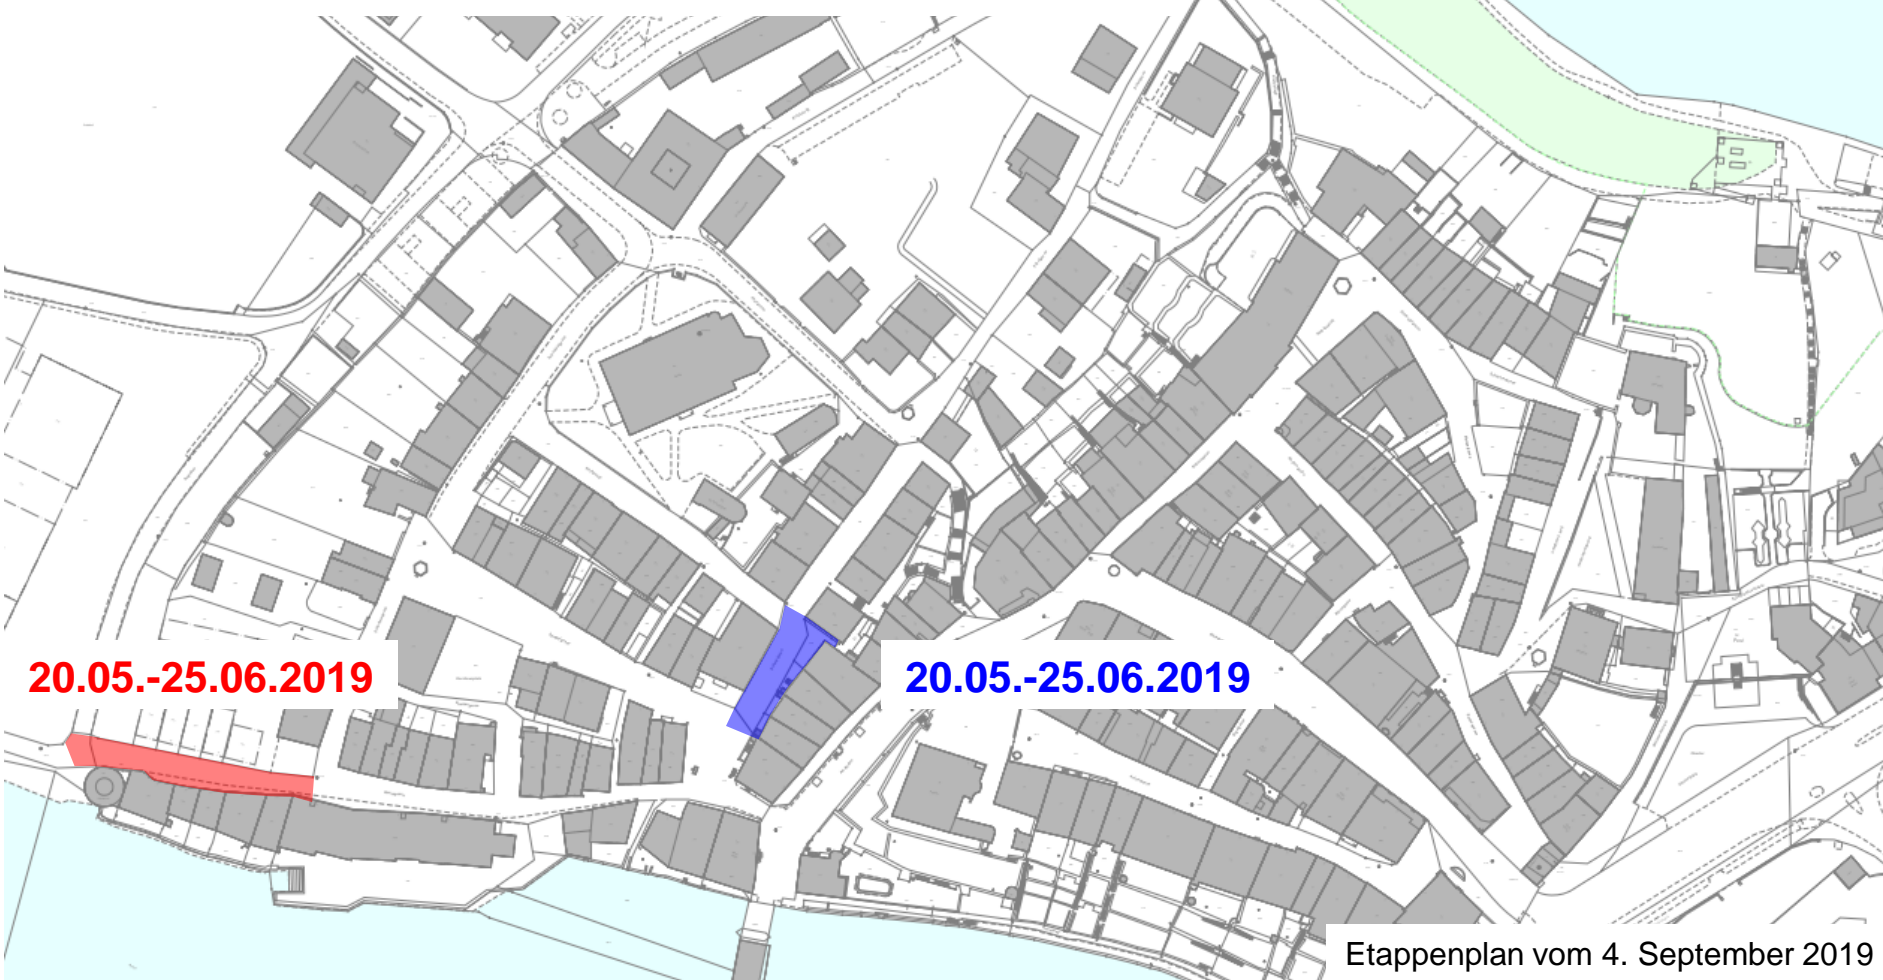

20.05.-25.06.2019


20.05.-25.06.2019

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 1 Reussgasse/Schenkgasse

Mitte Mai bis Anfang Oktober 2019

Dauer ca. 22 Wochen

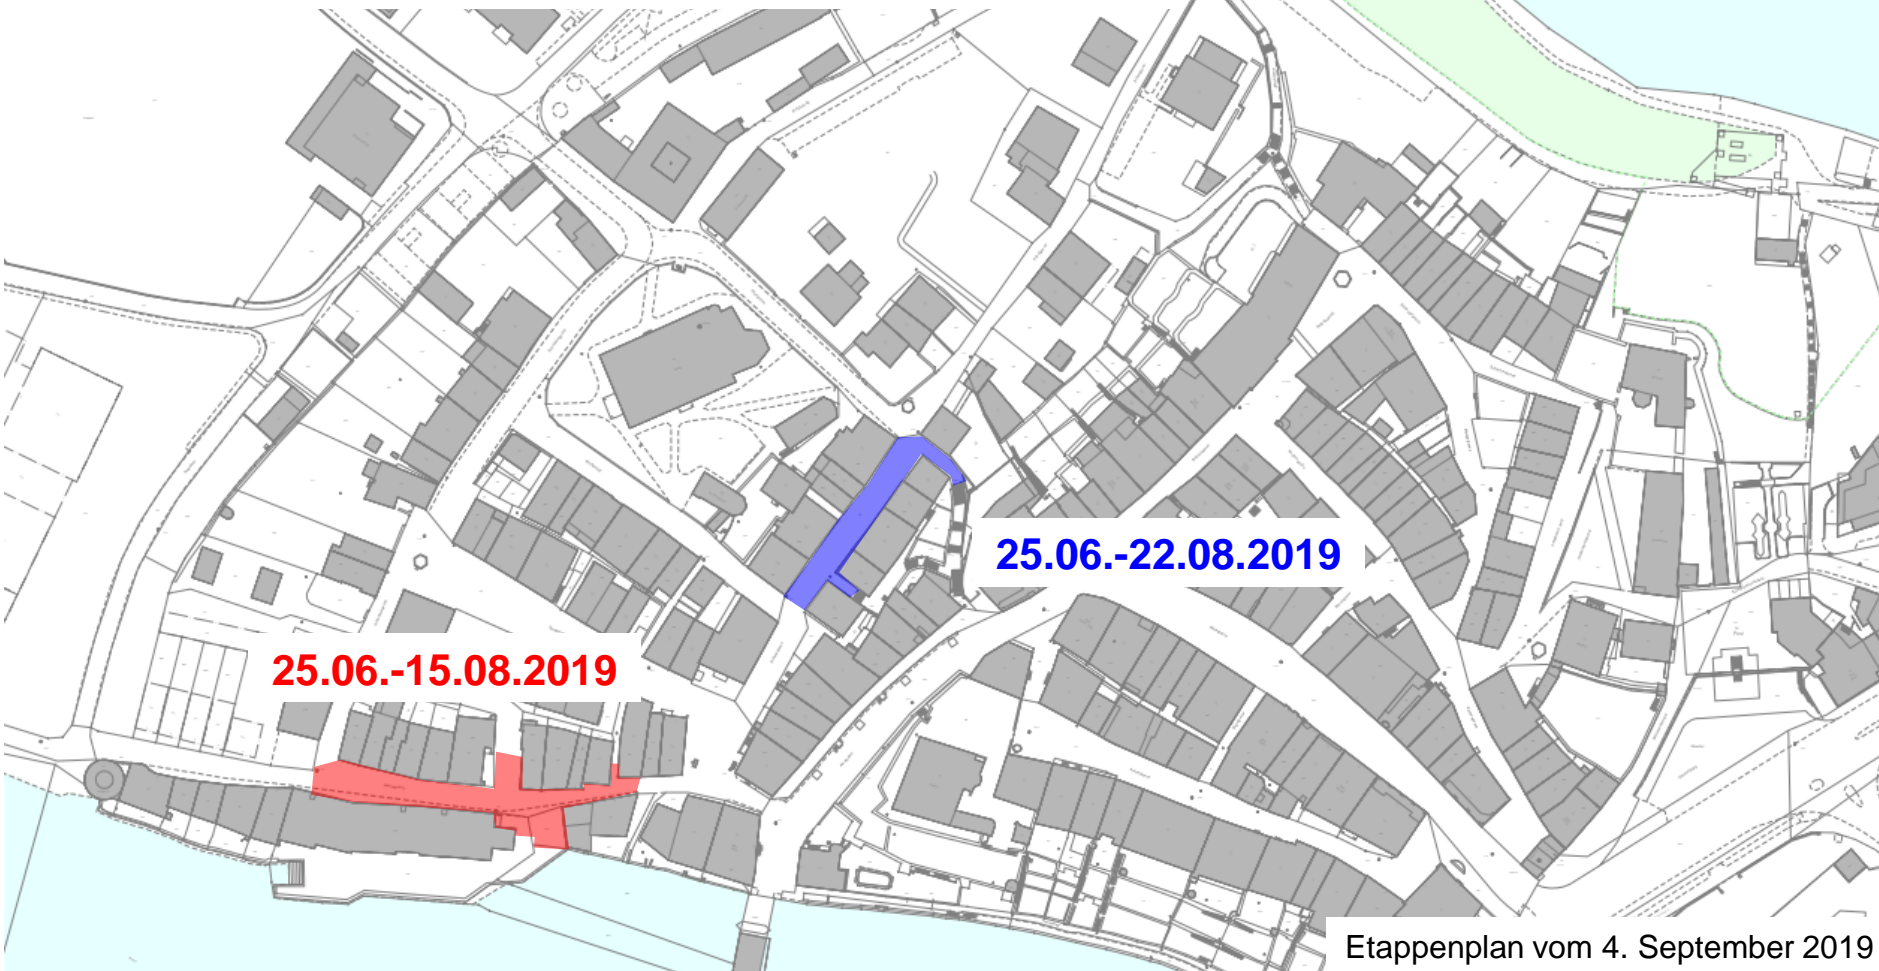


Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 1 Reussgasse/Schenkgasse

Mitte Mai bis Anfang Oktober 2019

Dauer ca. 22 Wochen

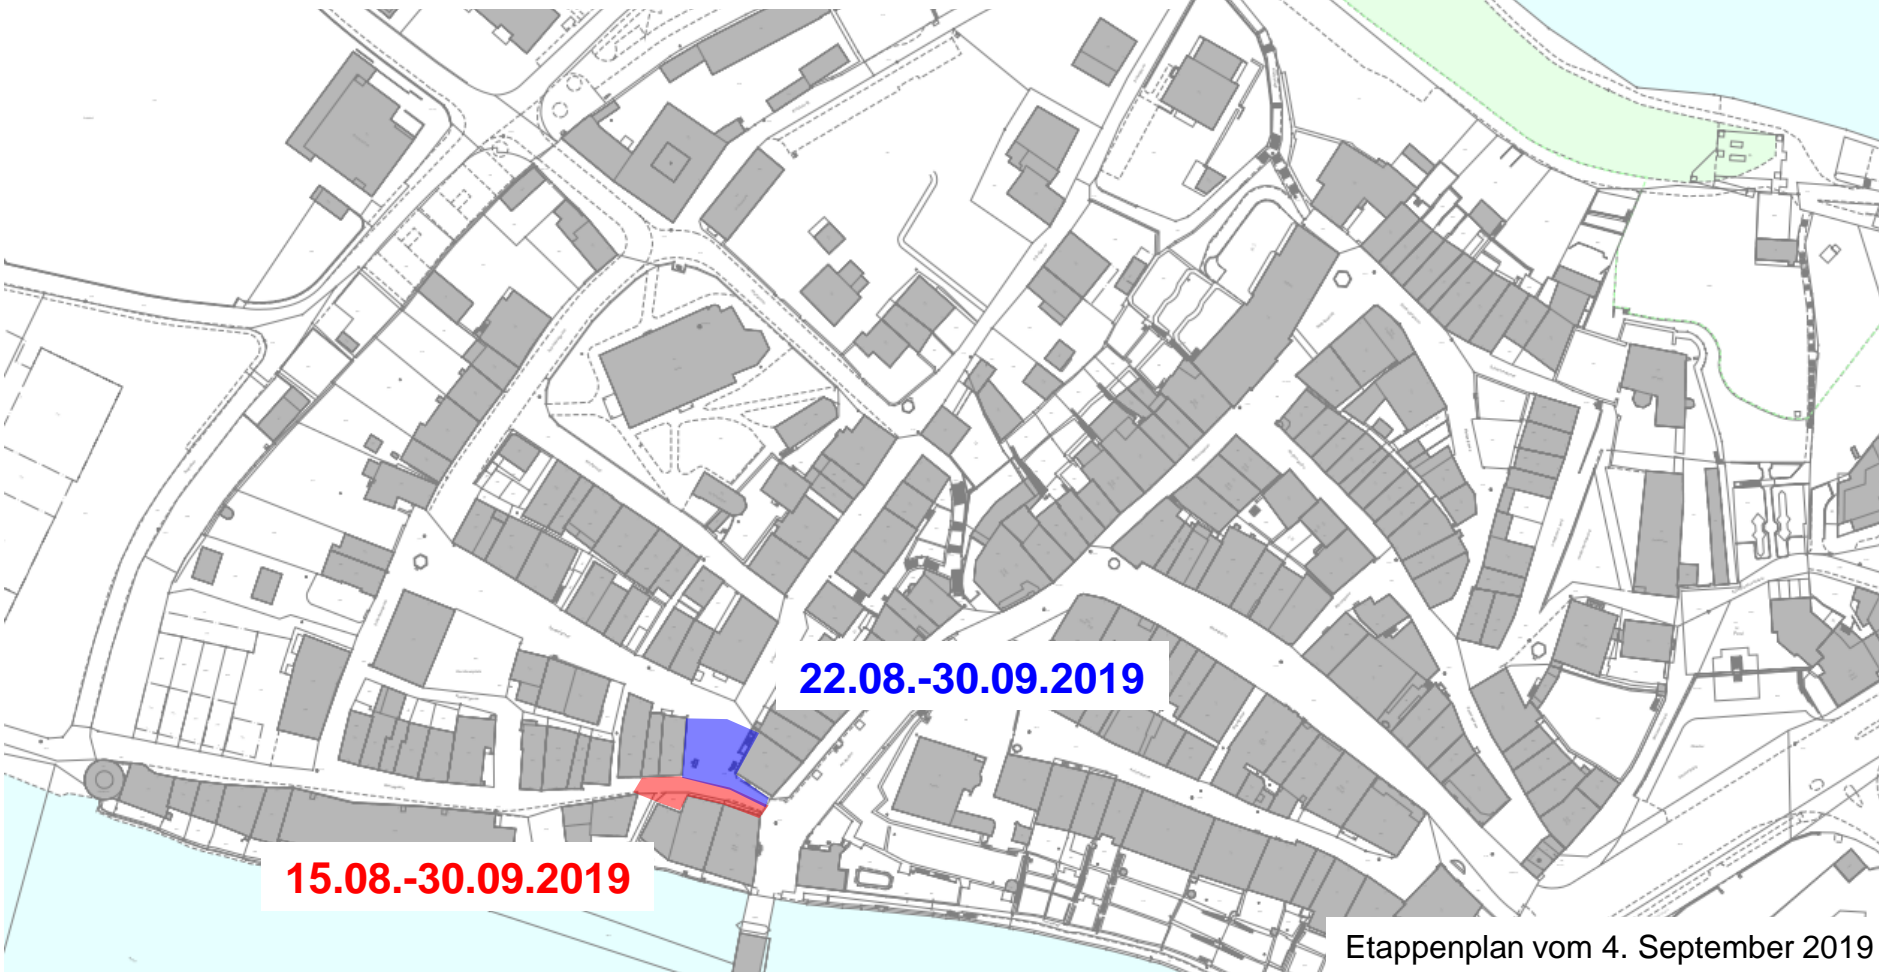

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 2 Schodolergasse 20, Neubaugasse, Schulgasse/Pfarrgasse

Anfang September bis Anfang Dezember 2019
Dauer ca. 13 Wochen




30.09-09.12.2019

30.09.-04.12.2019

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 3 Am Bogen/Marktgasse Bärengasse/Rechengasse

Anfang Dezember 2019 bis Mitte April 2020
Dauer ca. 18 Wochen

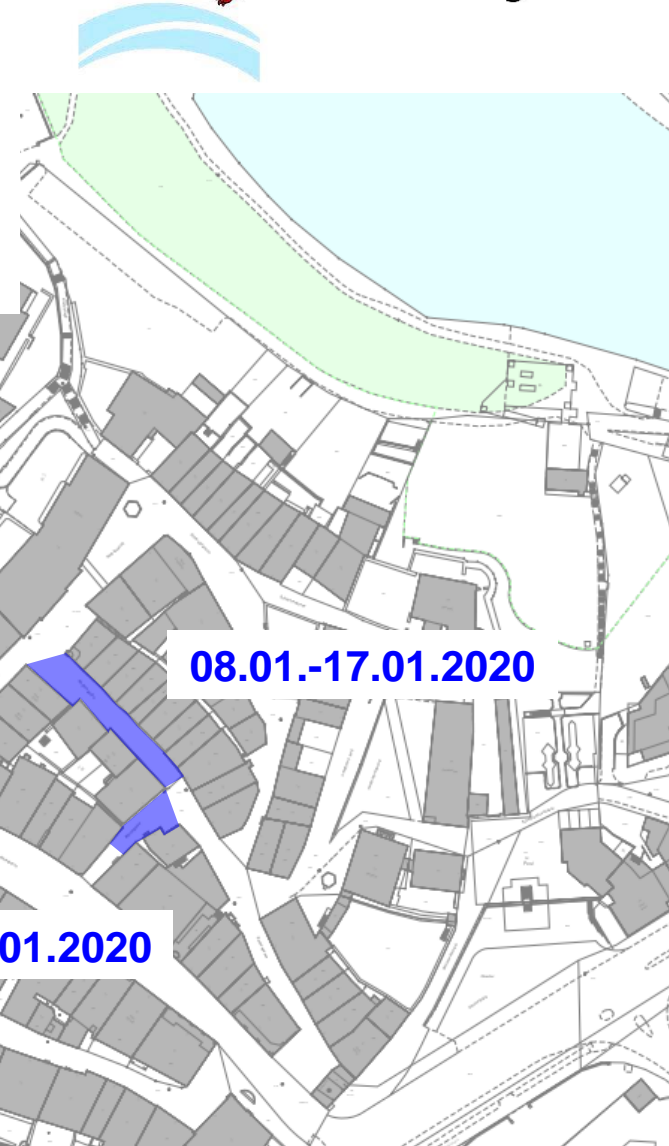

09.12.19-20.01.2020


09.12.19.-08.01.2020

08.01.-17.01.2020

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 3 Am Bogen/Marktgasse Bärengasse/Rechengasse

Anfang Dezember 2019 bis Mitte April 2020
Dauer ca. 18 Wochen

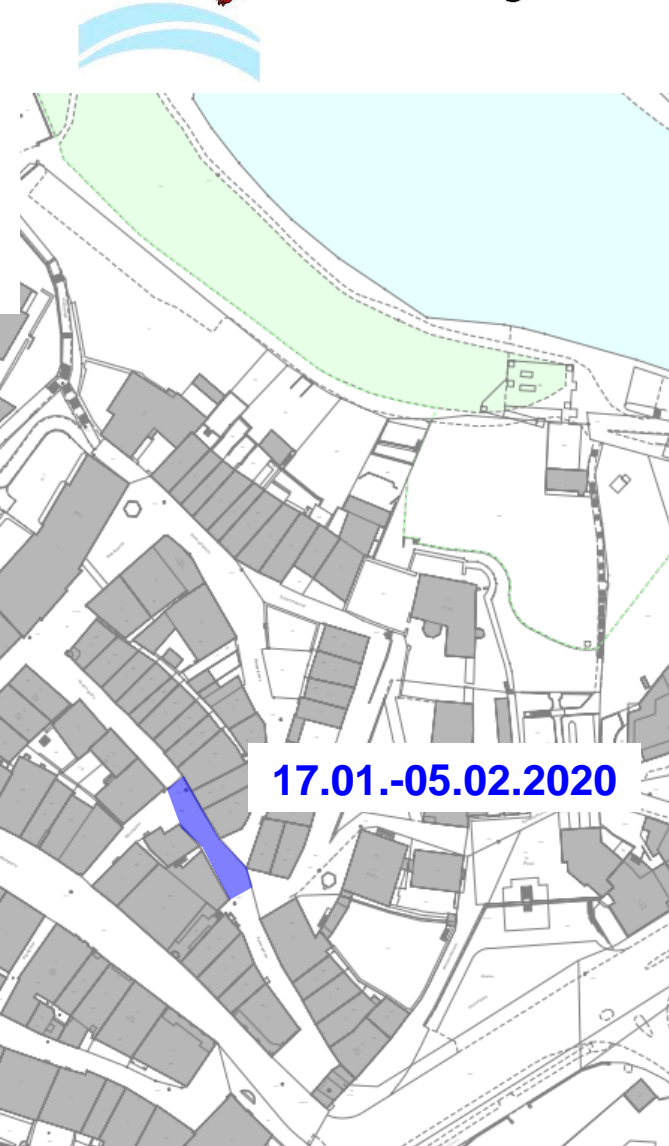

20.01.-05.02.2020

17.01.-05.02.2020

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 3 Am Bogen/Marktgasse Bärengasse/Rechengasse

Anfang Dezember 2019 bis Mitte April 2020
Dauer ca. 18 Wochen



05.02.-20.02.2020

05.02.-18.02.2020

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 3 Am Bogen/Marktgasse Bärengasse/Rechengasse

Anfang Dezember 2019 bis Mitte April 2020
Dauer ca. 18 Wochen



20.02.-16.03.2020


18.02.-28.02.2020

28.02.-12.03.2020

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 3 Am Bogen/Marktgasse Bärengasse/Rechengasse

Anfang Dezember 2019 bis Mitte April 2020
Dauer ca. 18 Wochen

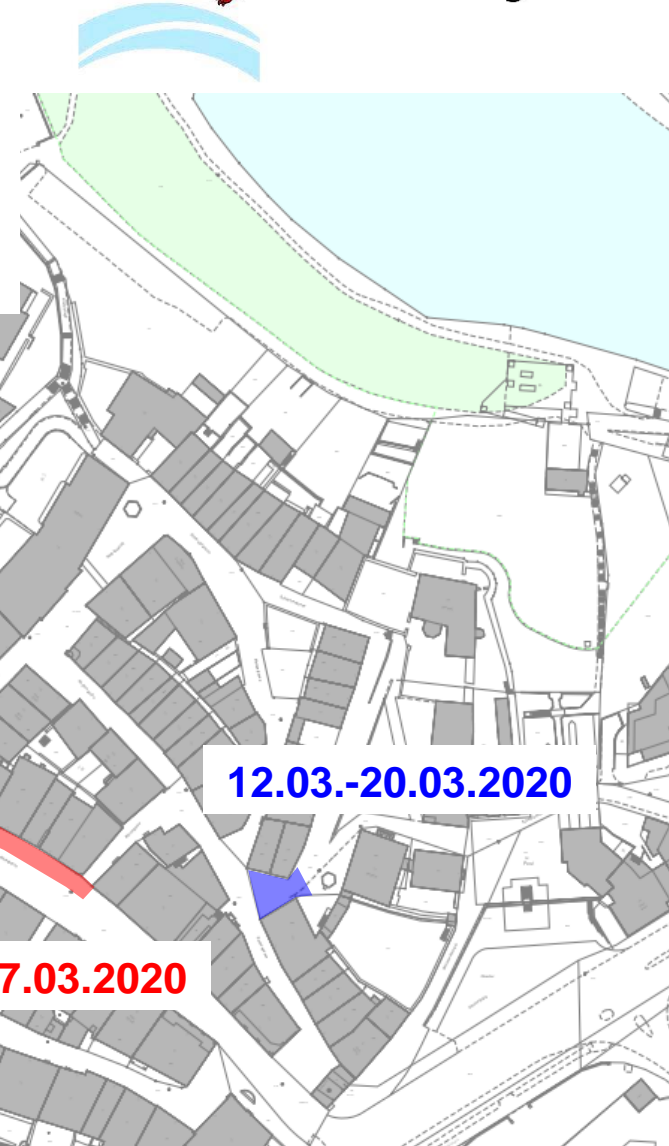

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 3 Am Bogen/Marktgasse Bärengasse/Rechengasse

Anfang Dezember 2019 bis Mitte April 2020
Dauer ca. 18 Wochen




20.03.-10.04.2020

27.03.-10.04.2020

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 4 Schodolergasse Schulgasse/Klosterweg

Mitte April 2020 bis Mitte September 2020
Dauer ca. 22 Wochen

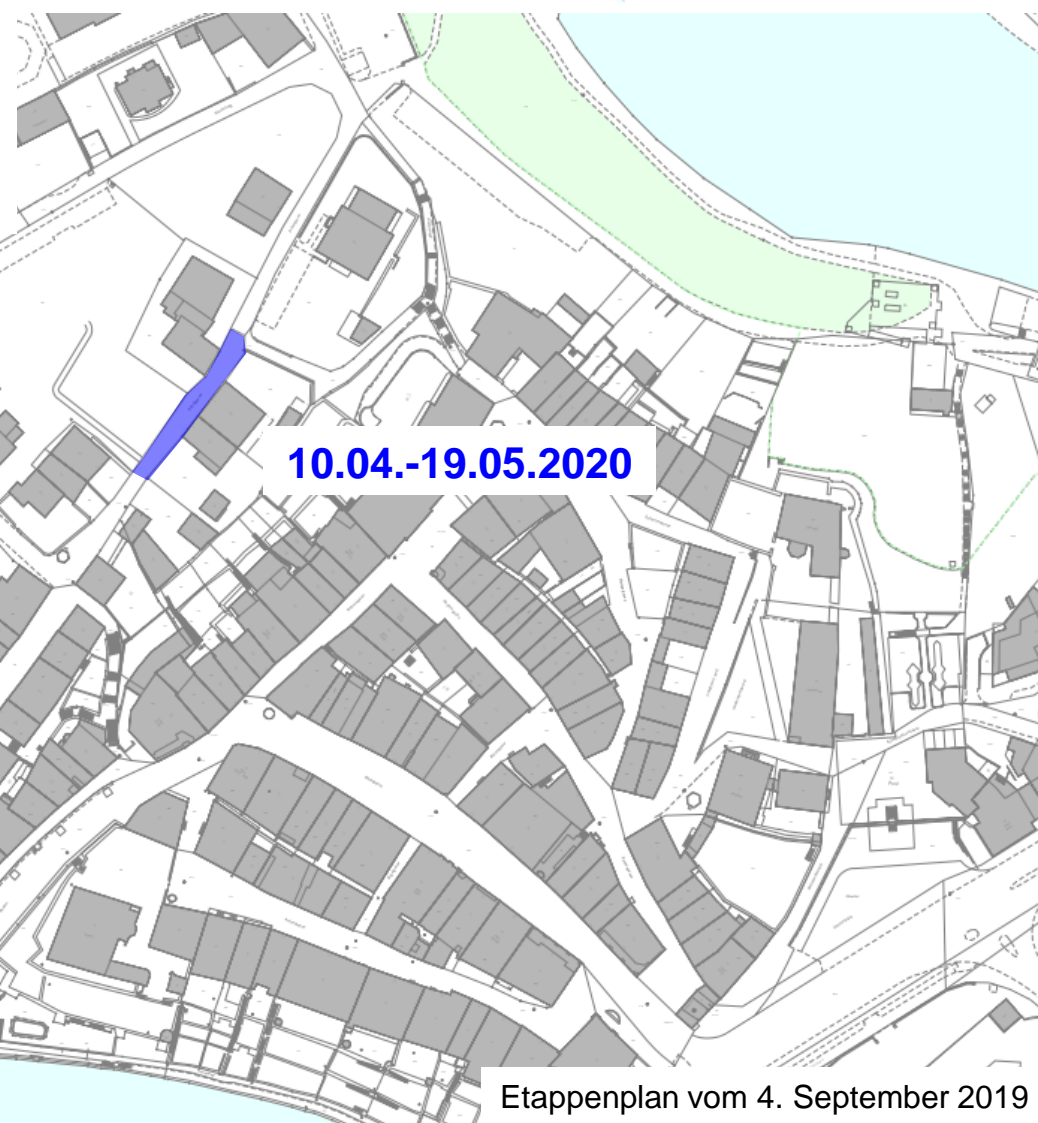


10.04.-19.05.2020

10.04.-15.05.2020

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 4 Schodolergasse Schulgasse/ Klosterweg


Mitte April 2020 bis Mitte September 2020
Dauer ca. 22 Wochen

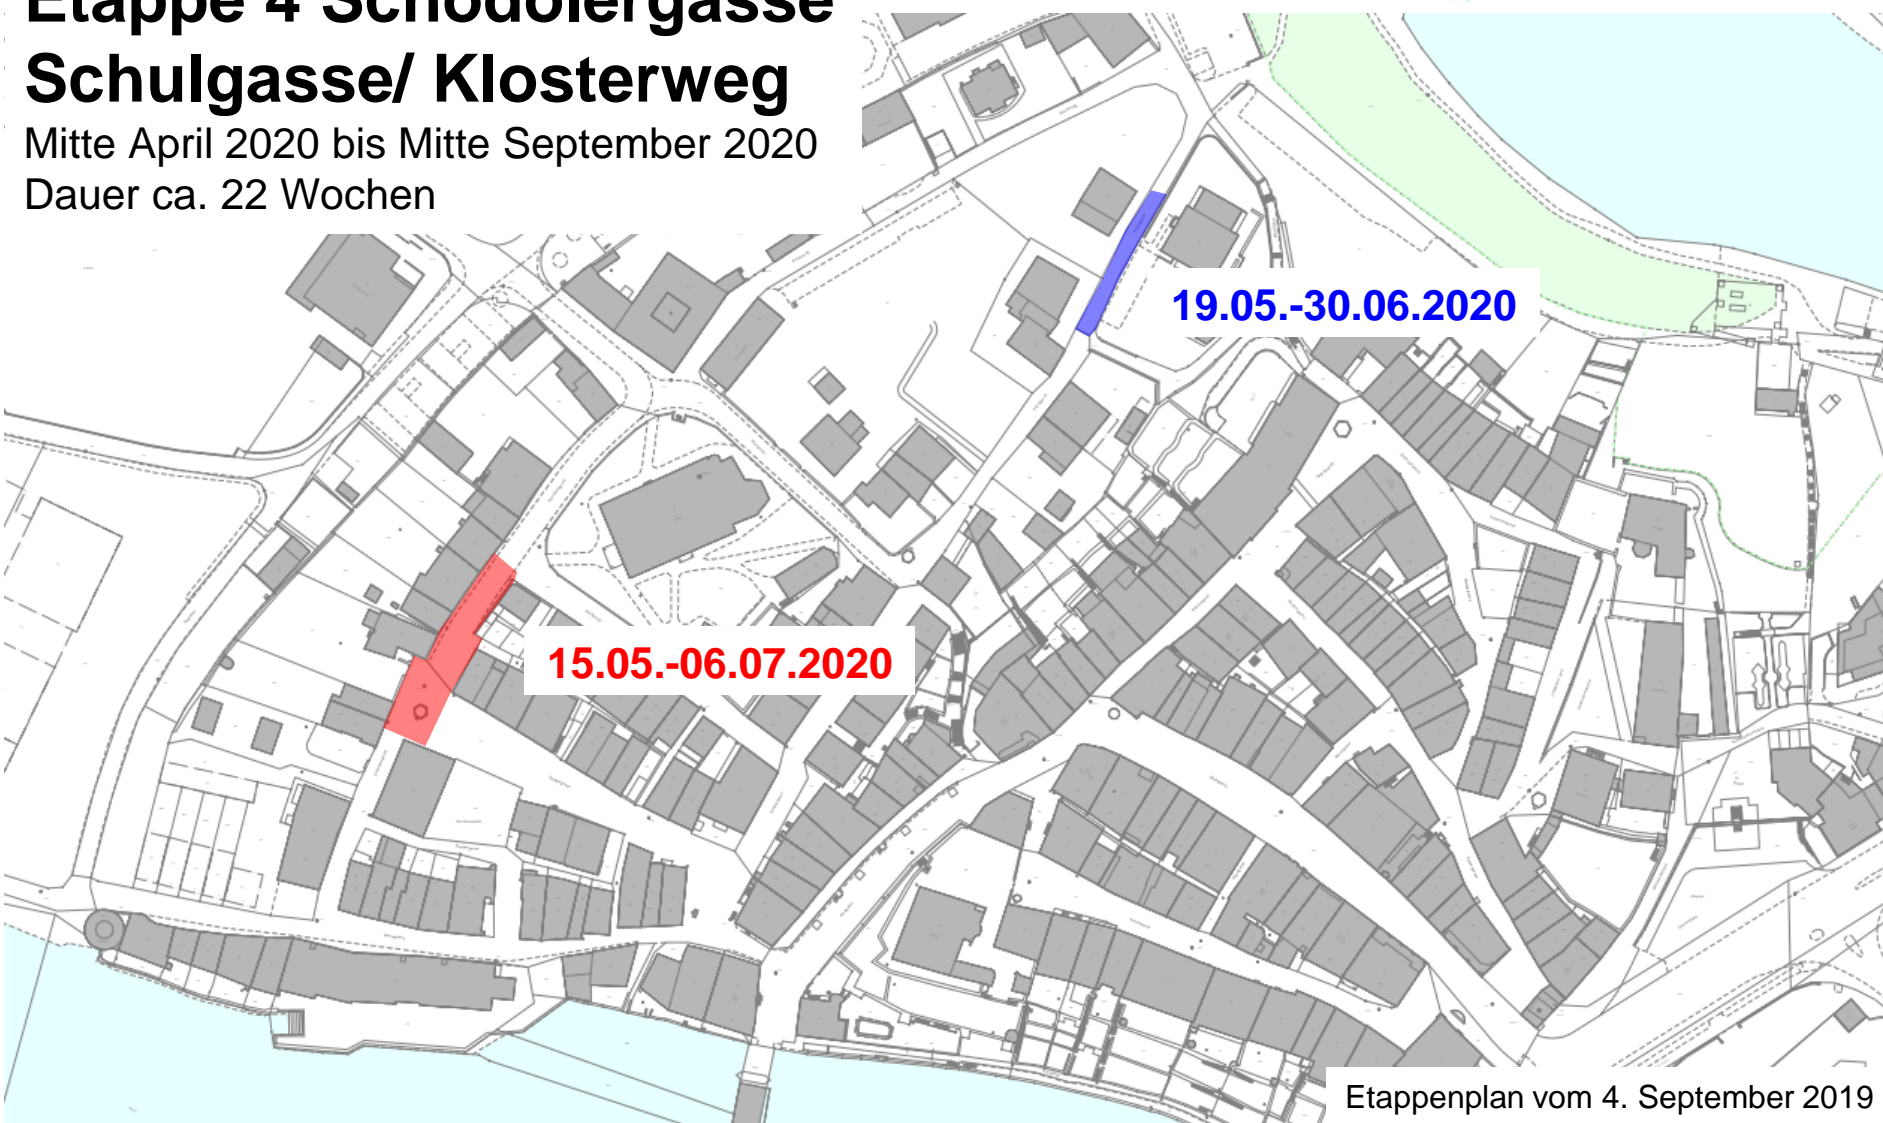

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 4 Schodolergasse Schulgasse/Klosterweg

Mitte April 2020 bis Mitte September 2020
Dauer ca. 22 Wochen

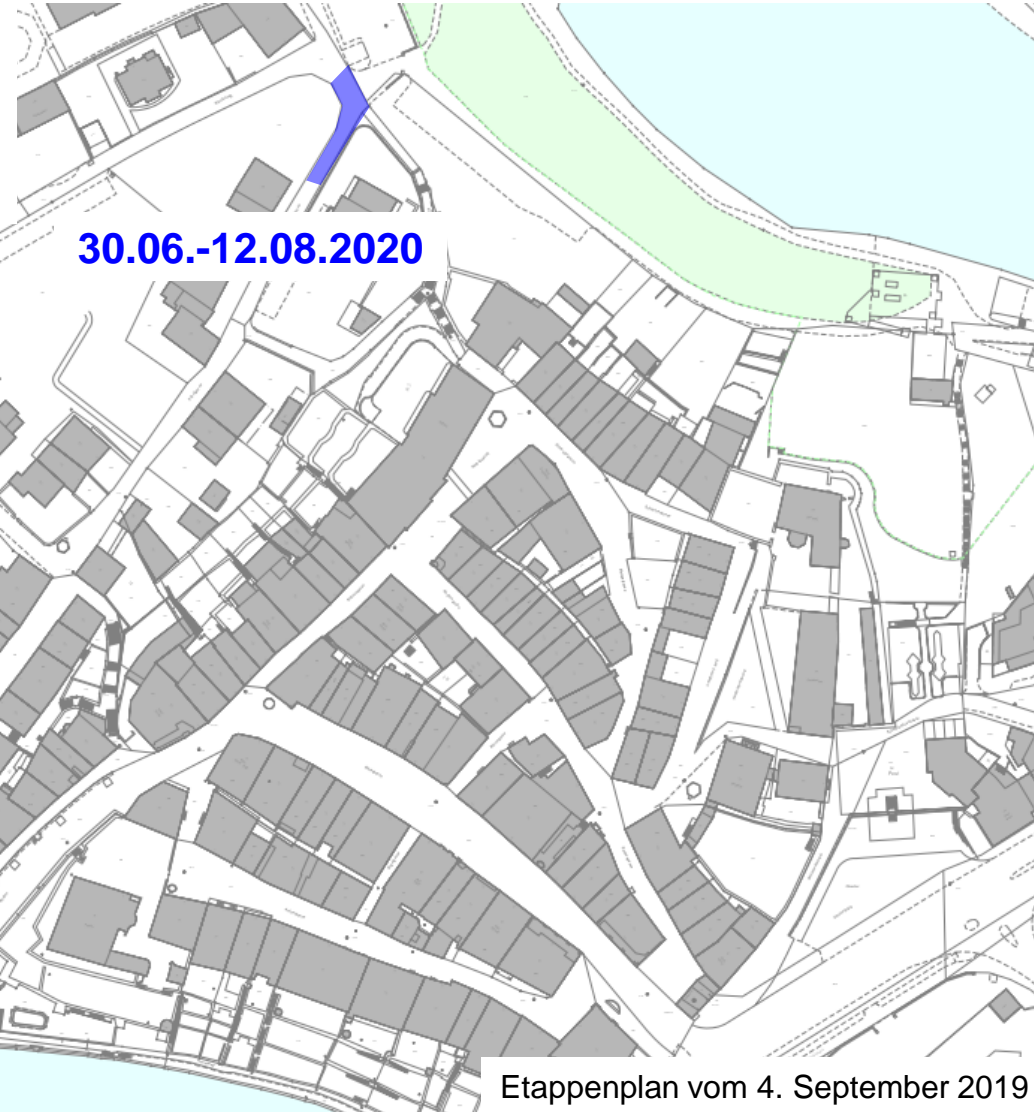


06.07.-31.08.2020

30.06.-12.08.2020

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 4 Schodolergasse Schulgasse/Klosterweg

Mitte April 2020 bis Mitte September 2020
Dauer ca. 22 Wochen

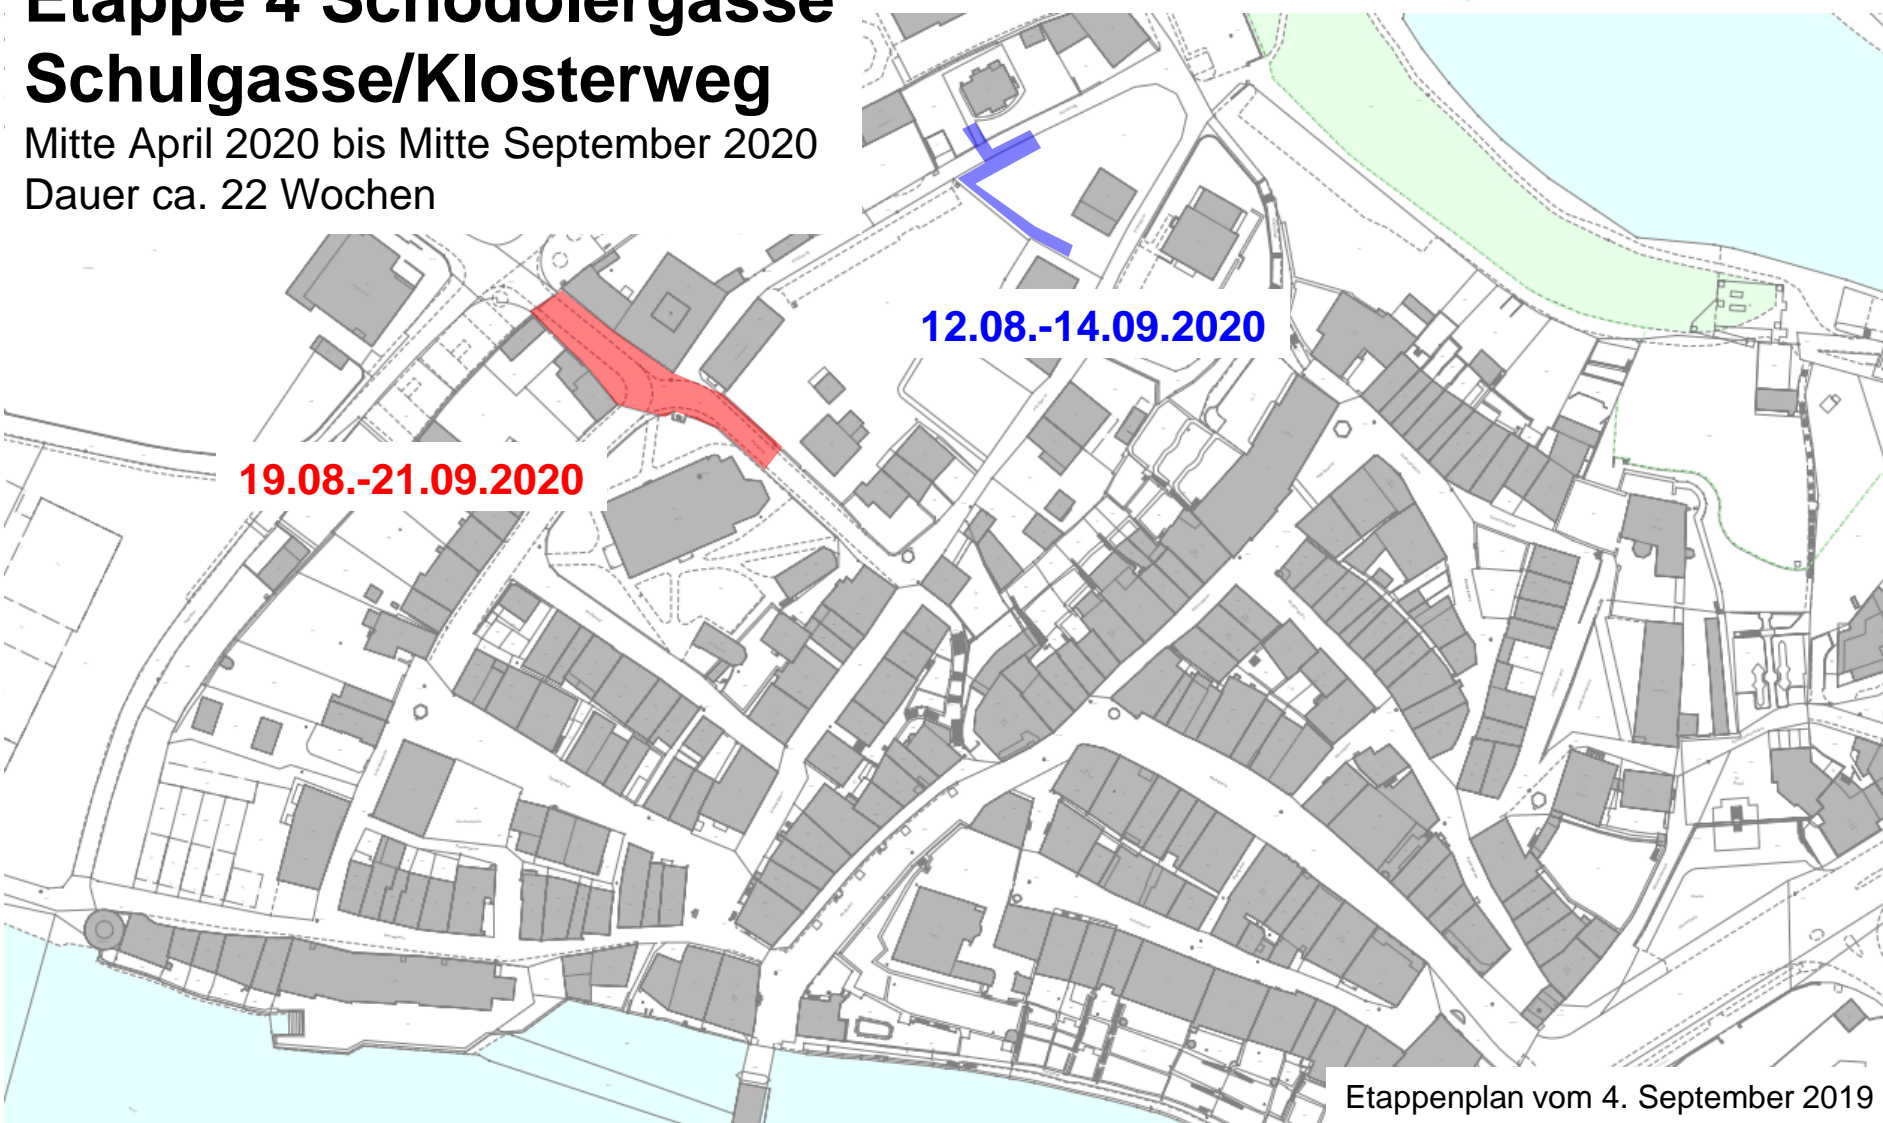

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 5 Kirchgasse Pfarrgasse

Mitte September 2020 bis Ende November 2020
Dauer ca. 11 Wochen




21.09.-16.10.2020

15.09.-19.10.2020

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 5 Kirchgasse Pfarrgasse

Mitte September 2020 bis Ende November 2020
Dauer ca. 11 Wochen

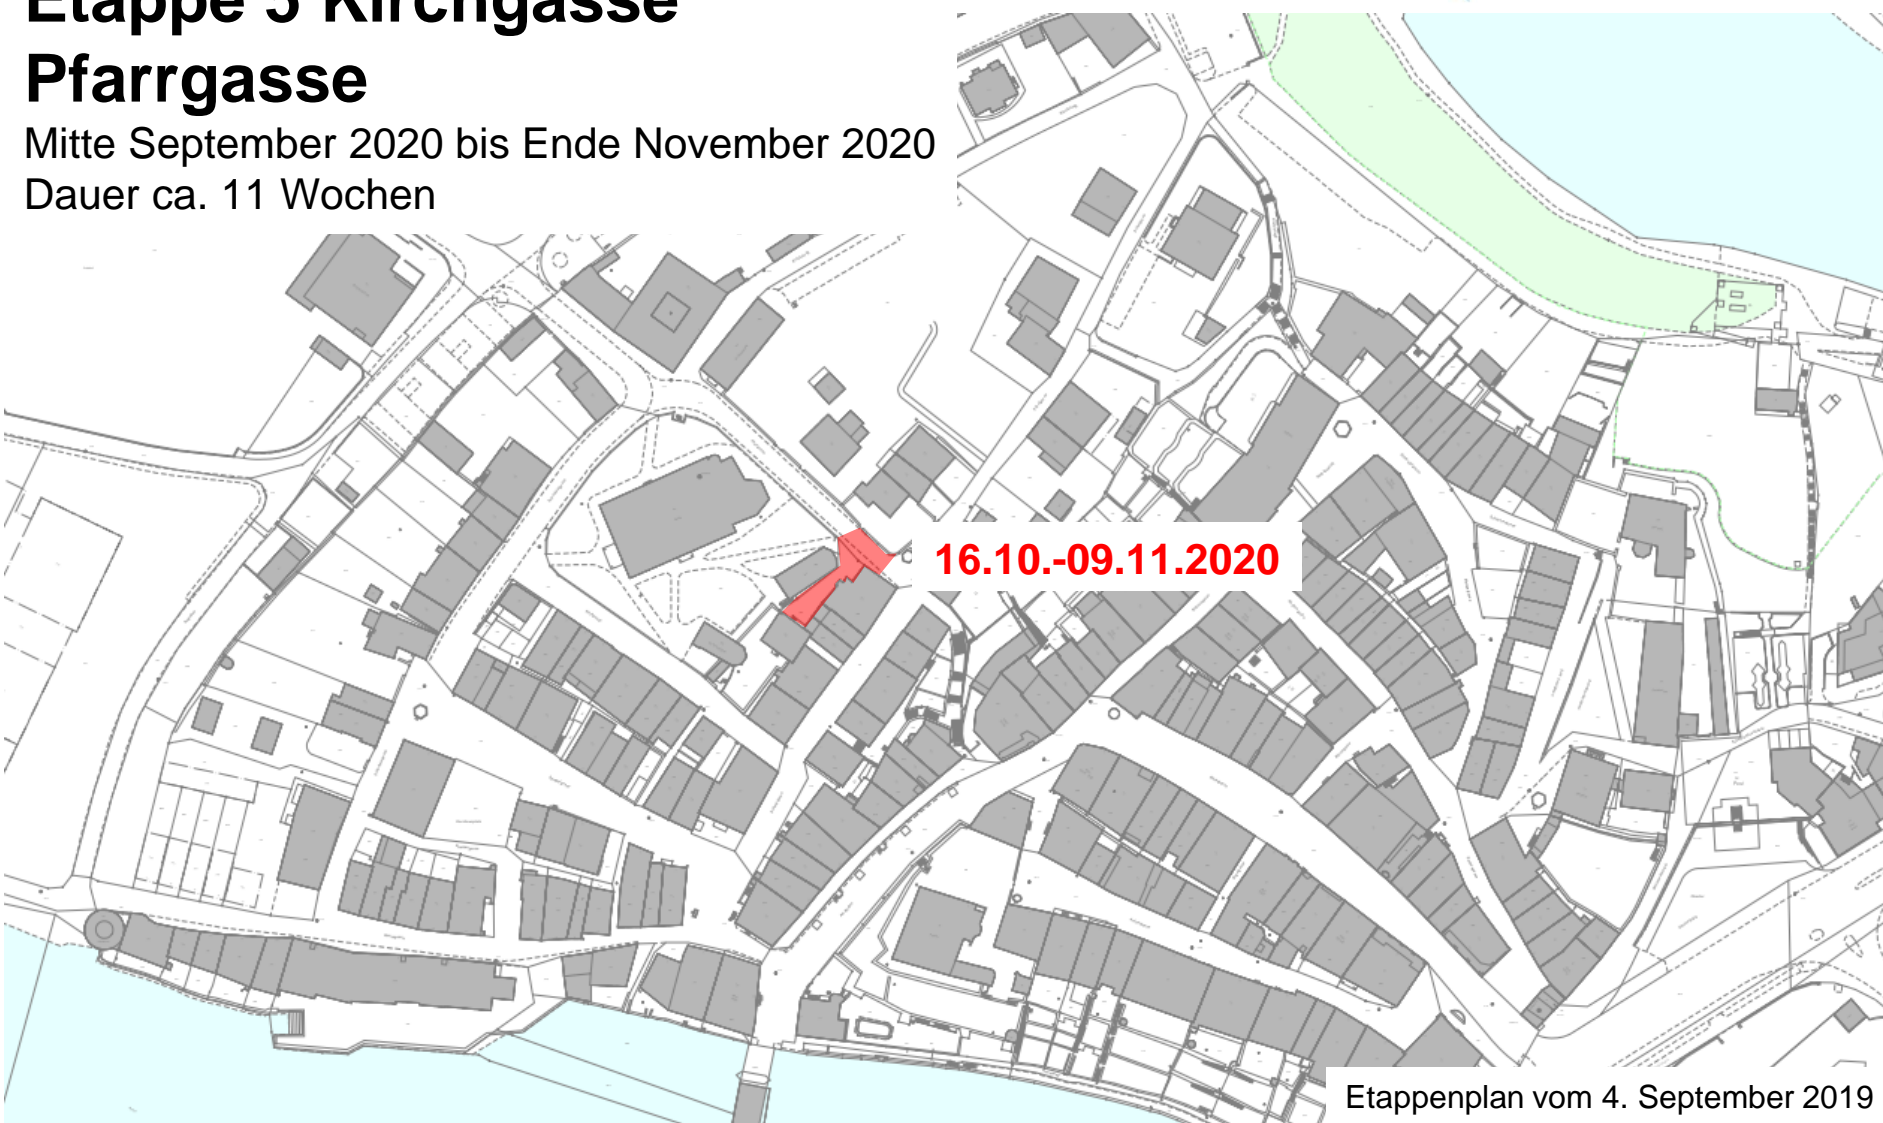

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 5 Kirchgasse

Mitte September bis Ende November 2020

Dauer ca. 11 Wochen

Etappe 6 Spiegelgasse

Ende Oktober bis Ende Dezember 2020

Dauer ca. 10 Wochen



19.10.-20.11.2020

19.10.-06.11.2020

Etappenplan vom 4. September 2019

Etappe 6 Spiegelgasse

Ende Oktober bis Ende Dezember 2020

Dauer ca. 10 Wochen



06.11.-20.11.2020

20.11.-23.12.2020

Etappenplan vom 4. September 2019
